



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílica en la azotea

ACCIONES REALIZADAS 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$154,286.00 M. N. (Son ciento cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

La construcción de este conjunto se inició alrededor del año 1588, el templo actual y la ampliación del ex convento datan probablemente siglo XVII.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón, que descansa sobre arcos con pilastras con basas y capiteles muy sencillos, formando en la nave cinco tramos.. Anexo al templo se localiza el ex convento.

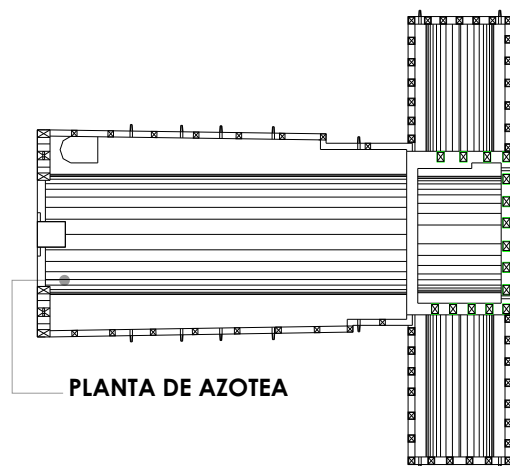

ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

