



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$129,290.00 M. N. (Son ciento veintinueve mil doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No hay ningún dato relativo a la construcción de la iglesia actual, pero posiblemente data de fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Una de las campanas tiene la fecha de 1728 y la pila bautismal es de 1738.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de tres naves cubierto con bóveda. La fachada esta rematada por dos torres de campanario y la espadaña al centro de un solo cuerpo. Detrás del presbiterio se localiza el camarín y en el costado norte se ubica el ex convento.

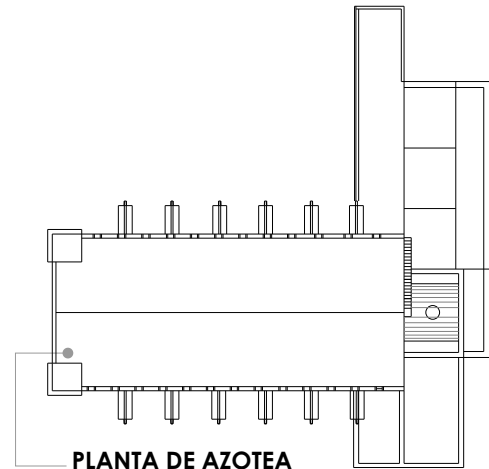

PLANTA DE AZOTEA

ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

PROCESO DE OBRA

