



FACHADA ACTUAL DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en azotea

ACCIONES REALIZADAS. 2003

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$426,800.00 M. N. (Son cuatrocientos veintiséis mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

La fecha de construcción del inmueble data del S. XVII. Al principio se construyó la capilla abierta y unos cuantos anexos. Posteriormente el convento se amplía y se construyen otros cuartos y el templo, que data del año de 1664. Al suprimirse las ordenes monásticas el convento se abandona quedando en ruina varios espacios. En el año de 1893 se reconstruyen el templo y la casa cural; el conjunto cuenta con una capilla en el costado sur que data del S. XVIII.

En el año de 2003, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de tres naves, con arcos y techumbre de bóveda de cañón con muros de mampostería. En la parte posterior se localiza el ex convento.

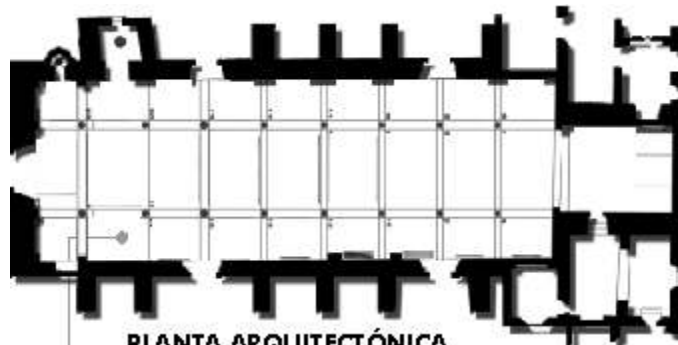

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROCESO DE OBRA

