



FACHADA DEL INMUEBLE

#### DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea del presbiterio

#### ACCIONES REALIZADAS. 2004

- Retiro de vegetación.
- Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilos y desagües pluviales del presbiterio.
- Inyección y calafateo de grietas
- Suministro de capa de impermeabilización acrílico
- Consolidación de coronas de muros del templo
- Sustitución de cubierta de la sacristía
- Reposición de cubierta del templo y capilla
- Colocación de piso de pasta en capilla
- Reposición de aplanados

#### MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$820,852.00 M. N. ( Son ochocientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional)


#### ANTECEDENTES

No se tienen datos precisos de la fecha de construcción de este inmueble, sus características arquitectónicas corresponden a la época colonial.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

#### DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una nave y está cubierto con una techumbre de dos aguas de lámina metálica. El presbiterio tiene bóveda de cañón. La sacristía y la capilla tienen losas planas.

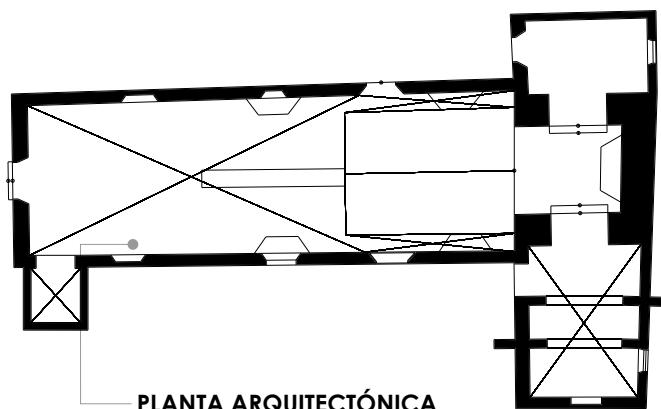

PLANTA ARQUITECTÓNICA

#### ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilos y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

#### OBRAS EN PROCESO

