



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Se necesita consolidar la fachada principal. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico en la azotea del presbiterio.

ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilos y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$6,730.00 M. N. (Son seis mil setecientos treinta pesos 00/100 moneda nacional)


ANTECEDENTES

No se tienen datos precisos de la fecha de construcción de este inmueble, por sus características arquitectónicas probablemente date del siglo XVII.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

La techumbre original de la nave era una bóveda de cañon corrido, la cual se derrumbó hace más de 50 años, el presbiterio tiene bóveda de cañon. En la nave el templo se habilitó una sección con una estructura de madera y cubierta a dos aguas de lámina metálica, a una altura mucho menor de los muros.

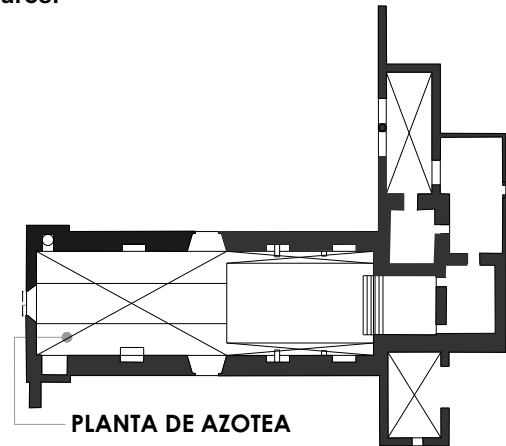

ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea, pretilos y muros del presbiterio

PROCESO DE OBRA
