

TEMPLO DE LA ASUNCIÓN TEMOZÓN, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

Se requiere mantenimiento, impermeabilización y pintura del templo (trabajos de albañilería, pintura, impermeabilización, acabados y limpieza) (incluye hasta el 3% de indirectos).



Estado anterior a las obras en los muros exteriores

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- ✦ Aplicación de impermeabilizante acrílico en azotea.
- ✦ Limpieza general de muros.
- ✦ Pintura caestina en muros exteriores, pretilos y pináculos.
- ✦ Restitución de aplanados.
- ✦ Mantenimiento de carpintería.
- ✦ Consolidación de mampostería.

MONTO DE LA INVERSIÓN


\$343, 812.00 M. N. (Son trescientos cuarenta y tres mil ochocientos doce pesos 00/100 moneda nacional)

ANTECEDENTES

Por las características de los espacios, materiales y sistemas constructivos empleados en este edificio, es posible que date de la época colonial (probablemente en el siglo XVIII).

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Sus muros son de mampostería y el techo es de bóveda de cañón corrido. Las puertas y ventanas son de madera y se encuentran decoloradas. Los muros presentan manchas por humedad. Se observa desprendimiento de acabados en muros y pretilos de azotea. En algunas áreas no tiene el achaflanado en las uniones entre el muro y losa de azotea. La pintura en muros exteriores se encuentra deteriorada. Se observa en la azotea manchas de humedad. La pintura del interior del templo se encuentra en buen estado de conservación.

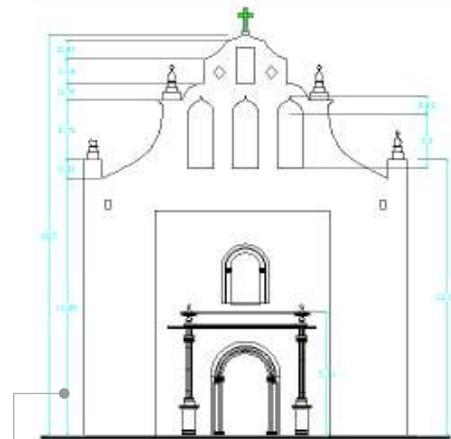

FACHADA DEL INMUEBLE

PROCESO DE OBRA

